

2 0 2 4

Secretaria de Estado
de Justiça e Segurança Pública



RELATÓRIO OBRAS E MANUTENÇÕES SULOT - Julho/2025

Acesse:



@seguranca.minas

@depenmg



seguranca.mg.gov.br

JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Panorama Geral (desde 2019)

Obras realizadas pela SEJUSP

2019 – 7 obras – 7,7 milhões - 14 vagas

2020 – 10 obras – 4,4 milhões

2021 – 12 obras – 7,6 milhões - 555 vagas

2022 – 13 obras – 27,6 milhões - 57 vagas

2023 – 15 obras – 16,1 milhões - 85 vagas

2024 – 15 obras – 19 milhões - 611 vagas

2025 – 8 obras – 0,5 milhões - 151 vagas

Valor Total: 82,9 milhões/ 1.473 vagas

Obras realizadas pela SEINFRA

2019 – 1 obra – 0,65 milhões

2020 – 3 obras – 1,48 milhões - 20 vagas

2021 – 4 obras – 10,14 milhões - 306 vagas

2022 – 8 obras – 93,8 milhões - 1.080 vagas

2023 – 0 obras – 0 milhões

2024 – 4 obras – 16,1 milhões - 388 vagas

2025_(previsto) – 6 obras – 79,9 milhões - 694 vagas

Valor Total : 202,1 milhões/ 2.488 vagas

**Total de Vagas geradas por
reforma, manutenção e construção**

3.961

UNIDADES CONSTRUÍDAS

Anexo de Alfenas 306 vagas

Anexo de Itajubá 306 vagas

Anexo de Divinópolis 306 vagas

Presídio de Ubá 388 vagas

Presídio de Iturama 388 vagas

UNIDADES EM CONSTRUÇÃO

Presídio de Frutal 388 vagas

Presídio de Itaúna 306 vagas

Presídio de Lavras 628 vagas

Presídio de Poços de Caldas 628 vagas

Obras em andamento

13 SEJUSP + 6 SEINFRA

PREVISÃO DE CONSTRUÇÃO

Ampliação do CERESP de Governador Valadares 240 vagas

Construção de unidades com recursos do TJ 2.400 vagas

44 obras previstas pela Diretoria de Infraestrutura

ÍNDICE

MANUTENÇÕES EM ANDAMENTO EXECUTADAS PELA SEJUSP:

- 1) Ceresp Juiz de Fora
- 2) Presídio Antônio Dutra Ladeira
- 3) Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade
- 4) Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade - Cozinha
- 5) Complexo Penitenciário de Juiz de Fora
- 6) Presídio de Campo Belo
- 7) Presídio de Curvelo
- 8) Penitenciária de Contagem I -Nelson Hungria
- 9) Penitenciária de Formiga
- 10) Penitenciária de Teófilo Otoni
- 11) Ceresp Gameleira
- 12) Ceresp de Ipatinga
- 13) Penitenciária de Ribeirão das Neves I - José Maria Alkimin



ÍNDICE



OBRAS E REFORMAS EXECUTADAS PELA SEINFRA:

- 1) Presídio de Frutal
- 2) Presídio de Itaúna
- 3) Penitenciária Francisco Floriano de Paula - Governador Valadares
- 4) CEIP Dom Bosco
- 5) CSE Montes Claros
- 6) CSE Sete Lagoas

ÍNDICE

MANUTENÇÕES CONCLUÍDAS PELA SEJUSP

Em 2025:

- 1) Complexo Penitenciário Nossa Senhora do Carmo
- 2) Penitenciária de Ribeirão das Neves I - José Maria Alkimin
- 3) GEPAER - José Maria Alkimin
- 4) Presídio de Ubá
- 5) Presídio de Alfenas (Anexo)

Em 2024:

- 1) Penitenciária de Teófilo Otoni
- 2) Penitenciária Agostinho de Oliveira Junior
- 3) Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto
- 4) Ceresp Gameleira
- 5) Presídio de João Monlevade
- 6) Presídio de Teófilo Otoni
- 7) Penitenciária Professor Aluísio Ignácio de Oliveira - Uberaba
- 8) Ceresp Betim
- 9) Hospital Jorge Vaz - Barbacena
- 10) Complexo São Joaquim de Bicas
- 11) Presídio de Vespasiano
- 12) Penitenciária José Maria Alkimin



ÍNDICE

OBRAS E REFORMAS CONCLUÍDAS PELA SEINFRA EM 2024:

- 1) CIA - BH
- 2) Complexo Penitenciário Nelson Hungria
- 3) CSE São Benedito
- 4) Presídio de Ubá (2ª Etapa)

OBRAS EXECUTADAS PELA VALE:

- 1) Construção Presídio em Lavras
- 2) Construção do Presídio em Poços de Caldas





MANUTENÇÕES EM ANDAMENTO EXECUTADAS PELA SEJUSP

JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



MINAS
GERAIS

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.


Ceresp Juiz de Fora

Objeto: Manutenção geral da unidade com foco no aumento de 200 novas vagas, além do aumento da reservação de água e adequação para AVCB.

Valor Previsto: **R\$ 12.500.000,00**

Valor Executado: **R\$ 11.958.072,87**

Tipo de Recurso: **VALE**



95,7% de execução

Status: Em andamento regular. Já houve entrega parcial dos alojamentos. Intervenção em vias de finalizar, mas paralisada devido à pendência de regularização junto a CEMIG para ligação da subestação de energia.

Detalhamento: Foram realizadas intervenções para melhoria do pavilhão, aumento da reservação de água, drenagem e para a viabilização de nova subestação de energia. Os serviços para adequação do PSCIP e adequação da subestação estão em andamento.



Previsão de término: Julho/2025



Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA

**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Presídio Antônio Dutra Ladeira

Objeto: Melhorias no pavilhão e instalação de Gradeamento no perímetro do pátio do pavilhão III.

Valor Previsto: **R\$ 6.433.877,28**

Valor Executado: **R\$ 5.585.721,16**

Tipo de Recurso: **VALE**



87 % de execução

Status: Em andamento Regular. Houve alteração de previsão de término em função da necessidade de nova OS para o serviço de impermeabilização.

Primeira etapa concluída em 04/10/2023 (Adequação e ampliação de vagas do Pavilhão III). Início da nova OS para o Gradeamento do Pátio em 03/05/2024. Processo de medição atrasado.

Detalhamento: Execução de instalações elétricas, hidráulica, reboco das fachadas e execução de beliches. Instalação de gradeamento no perímetro do pátio do pavilhão III.



Previsão de término: Julho/2025



Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade

Objeto: Manutenção do espaço da Casa do Albergado, para a implantação de novo CRGPL.

Valor Previsto: **R\$ 3.129.079,27**

Valor Executado: **R\$ 2.065.476,38**



66 % de execução

Tipo de Recurso: **SAÚDE**



Status: **Obra Paralisada**, em função da discordância de projetos com o DEPEN e MP. Necessidade de reformulação dos projetos executivos e de incêndio para retomada da obra.

Detalhamento: Os serviços em andamento incluem o remanejamento de instalações hidráulicas, a remoção de portões para substituição de esquadrias nos alojamentos e alvenaria para fechamento de ambientes. Os serviços finalizados envolvem a conclusão de escavações e execução de contrapiso no refeitório, e construção de divisórias internas no trocador e vestiário, pintura.



Previsão de término:

Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade

Objeto: Manutenção da cozinha.

Valor Previsto: **R\$ 716.158,24**

Valor Executado: **R\$ 342.045,52**

Tipo de Recurso: **SAÚDE**



47,8 % de execução

Status: Em andamento regular.

Detalhamento: Serviços necessários para manutenção na infraestrutura e edificações da cozinha. Substituição de pisos, bancadas e portões, adequação das instalações elétricas, esquadrias e paredes danificadas.



Previsão de término: Outubro/2025



Complexo Penitenciário de Juiz de Fora

Objeto: Execução de Alambrado e Ligação do Reservatório.

Valor Previsto: **R\$ 4.200.000,00**

Valor Executado: **R\$ 2.568.156,71**

Tipo de Recurso: **VALE**



61,2 % de execução

Status: Em Andamento regular. Aumento de valor em função da execução de serviço de ligação do reservatório instalado que foi iniciada em 06/07/2025.

Detalhamento: Estão sendo realizados serviços de manutenção e prevenção, como alimentação e distribuição de água dos novos reservatórios metálicos, substituição das caixas d'água danificadas, demolição do muro danificado e execução de novo fechamento em alambrado, muro de contenção na via de acesso principal e regularização e proteção de taludes erodidos do complexo.



Previsão de término: Agosto/2025


Presídio de Campo Belo

Objeto: Manutenção para melhorias na infraestrutura, com previsão de geração de 211 vagas.

Valor Previsto: **R\$ 2.990.000,00**

Valor Executado: **R\$ 2.774.000,41**

Tipo de Recurso: **VALE**



92,8 % de execução

Status: Em andamento regular.

Detalhamento: Execução de serviços de reparos preventivos e corretivos, instalações, adaptações, recuperação e conservação das instalações elétricas e hidrossanitárias. Manutenção dos alojamentos, pintura e revestimento.



Previsão de término: Agosto/2025



Presídio de Curvelo

Objeto: Manutenção para melhorias na infraestrutura da Unidade.



Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Valor Previsto: **R\$ 2.990.000,00**

Valor Executado: **R\$ 2.108.503,63**

Tipo de Recurso: **VALE**



70,5 % de execução

Status: Em andamento regular.

Detalhamento: Execução de serviços de reparos preventivos e corretivos, instalações, adaptações, recuperação e conservação nas instalações elétricas, hidráulicas e fundação. Manutenção no muro e na estrutura física das celas 08 e 11.



Previsão de término: Novembro/2025

JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Penitenciária de Contagem I - Nelson Hungria

Objeto: Execução de Serviços de reparos, recuperação, instalações e modernização da cozinha.

Valor Previsto: **R\$ 2.514.480,05**

Valor Executado: **R\$ 1.482.042,03**

Tipo de Recurso: **MP**



58,9 % de execução

Status: Em andamento regular.

Detalhamento: Reorganização e qualificação dos espaços internos, recuperação de piso, substituição e revisão de esquadrias, revisão da rede elétrica e hidrossanitária, reestruturação do telhado e rampa de acesso.



Previsão de término: Novembro/2025




Penitenciária de Formiga

Objeto: Execução de Alambrado e Manutenção Hidrossanitária.

Valor Previsto: **R\$ 2.200.000,00**

Valor Executado: **R\$ 1.584.839,16**

Tipo de Recurso: **VALE**



72,1 % de execução

Status: Em andamento regular.

Detalhamento: Instalação de alambrado de segurança no entorno de unidade e instalação de reservatórios de água de polietileno na área externa para suprir o abastecimento de água, devido problemas oriundos do déficit da rede pública.



Previsão de término: Janeiro/2026


Penitenciária de Teófilo Otoni I

Objeto: Manutenção e adequação de parte do Bloco Cozinha/Refeitório com implantação de Fábrica de Fraldas e Absorventes.

Valor Previsto: **R\$ 120.000,00**

Valor Executado: **R\$ 95.899,63**

Tipo de Recurso: **VALE**



79,9 % de execução

Status: Em andamento regular.

Detalhamento: Serviços para modernização do espaço da Fábrica de Fraldas e Absorventes. Com adequações nas instalações elétricas, hidrossanitárias e pintura.




Previsão de término: Agosto/2025



Cersp Gameleira


Objeto: Execução de Serviços PSCIP.

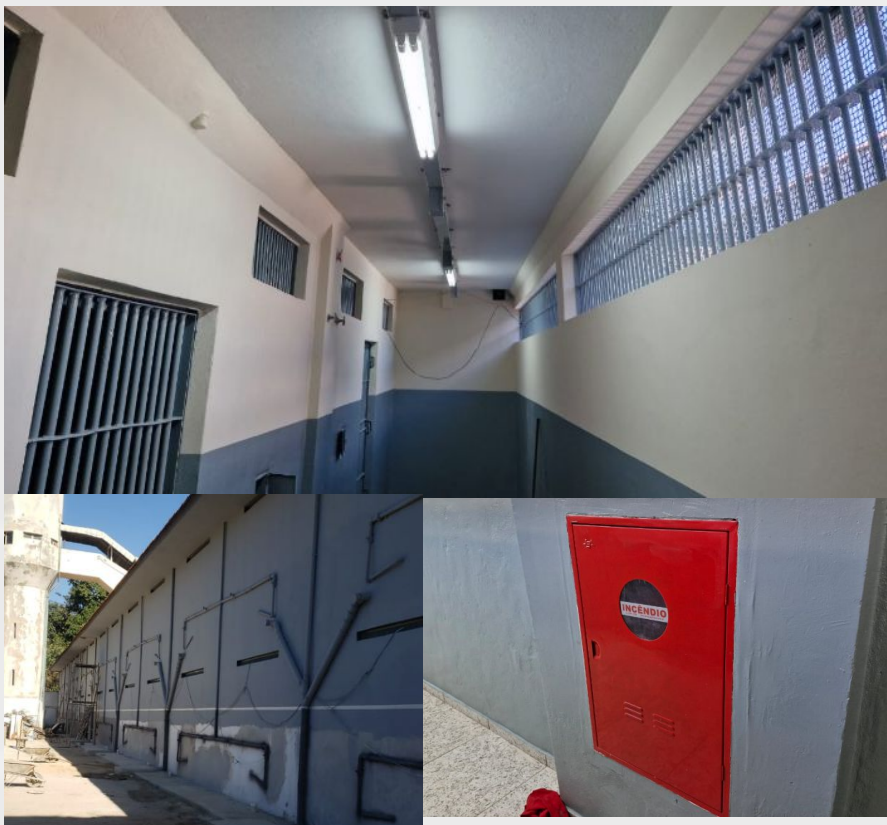

Valor Previsto: **R\$ 596.447,21**

Valor Executado: **R\$ 79.263,74**

Tipo de Recurso: **VALE**



13,3 % de execução

Status: Em andamento regular. Consultoria está alterando o projeto para atender ao pedido do DEPEN. Há possibilidade de atraso devido ao exposto.

Detalhamento: Execução de Serviços Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico - PSCIP. Complemento à Manutenção geral dos pavilhões com aumento de 384 novas vagas.



Previsão de término: Outubro/2025

Ceresp de Ipatinga

Objeto: Recuperação de Parte das Muralhas Externas.



Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Valor Previsto: **R\$ 170.000,00**

Valor Executado: **R\$ 0,00**

Tipo de Recurso: **VALE**



0,00 % de execução

Status: Início dos serviços em 16/06/2025. Primeira medição pendente.

Detalhamento: Execução de Serviços Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico - PSCIP. Complemento à Manutenção geral dos pavilhões com aumento de 384 novas vagas.



Previsão de término: Dezembro/2025

JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Penitenciária de Ribeirão das Neves I - José Maria Alkimin

Objeto: Adequações na infraestrutura do Pavilhão Máxima, com o objetivo de criar um corredor de fluxo dos internos para as atividades laborais externas.

Valor Previsto: **R\$ 166.822,69**

Valor Executado: **R\$ 0,00**

Tipo de Recurso: **VALE**



0,00 % de execução

Status: Início dos serviços em 01/06/2025. Primeira medição pendente.

Detalhamento: Execução de Serviços Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico - PSCIP. Complemento à Manutenção geral dos pavilhões com aumento de 384 novas vagas.



Previsão de término: Agosto/2025





OBRAS E REFORMAS DA SEJUSP EXECUTADAS PELA SEINFRA

JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



MINAS
GERAIS

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Presídio de Frutal

Objeto: Construção do Presídio de Frutal - 388 vagas.



Valor Previsto: **R\$ 34.814.360,76**

Valor Executado: **R\$ 34.142.403,34**

Tipo de Recurso: **FUNPEN**



98,1 % de execução física

Status: Serviços concluídos, aguardando vistoria final, prevista para final de julho.



Previsão de término: Julho/2025

Presídio de Itaúna

Objeto: Construção da Cadeia Pública Masculina de Itaúna - padrão 306 vagas.



Valor Previsto: **R\$ 31.773.141,07**

Valor Executado: **R\$ 29.704.117,29**

Tipo de Recurso: **FUNPEN**



100% de execução física

Status: Serviços concluídos. Ainda há pendências de pagamentos das medições finais.

Termo de Recebimento Provisório assinado.

Ainda há pendências das redes de água e esgoto, em que os projetos estão sendo elaborados pela prefeitura e pelo SAAE, acompanhados pela SEINFRA.



Término: Junho/2025


Penitenciária Francisco Floriano de Paula - Governador Valadares

Objeto: Construção do Sistema de abastecimento de água (ETA).

Valor Previsto: **R\$ 4.860.886,99**

Valor executado: **R\$ 3.968.547,20**

Tipo de Recurso: **FUNPEN**



88,55 % de execução física

Status: Em andamento.

A obra foi iniciada em dezembro de 2023 e visa a melhoria da infraestrutura hídrica da unidade.



Previsão de término: Agosto/2025



CEIP Dom Bosco

Objeto: Reforma geral da unidade.



100 % de execução



Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Valor Previsto: **R\$ 2.214.200,72**

Valor Executado: **R\$ 1.684.463,28**

Tipo de Recurso: **VALE**

Status: Serviços Concluídos. Vistoria de Entrega dia 10/07. Ainda há execução de recursos.

Detalhamento: Reforma geral elétrica, hidráulica, reboco e pintura geral dos núcleos 01 a 04, construção de passarela entre os núcleos, reforma da cobertura (telhado), execução de drenagem e esgoto na área externa aos núcleos, instalação de concertina em diversos pontos da unidade e ressignificação do banheiro anexo a escola, transformando-o em dois banheiros; sendo um masculino, outro feminino, além de criar uma divisão para servir como depósito, instalação de aquecedor solar térmico de 600 litros com placas coletoras para atender a demanda do núcleo.



Término: Julho/2025

JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

CSE Montes Claros


Objeto: Reforma geral.



Valor Previsto: **R\$ 2.782.672,49**

Valor Executado: **R\$ 2.085.477,62**

Tipo de Recurso: **VALE**



80,85 % de execução física

Status: Andamento em atraso, blocos C e D foram concluídos. Termo Aditivo de Prazo em elaboração.

Detalhamento: Reforma geral da unidade, incluindo instalações elétricas, instalações hidráulicas e pintura de dois alojamentos, incluindo ambiente onde estão instaladas ala médica, odontologia e enfermaria.



Previsão de término: Outubro/2025

CSE Sete Lagoas

Objeto: Reforma geral.




Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Valor Previsto: **R\$ 3.681.928,88**

Valor Executado: **R\$ 3.477.814,20**

Tipo de Recurso: **VALE**



94,5 % de execução física

Status: Serviços foram concluídos e outorga do poço emitida. Contrato será retomado para finalização.

Detalhamento: Reforma geral dos alojamentos do núcleo II incluindo muro adjacente, das instalações elétricas, instalações hidráulicas e reparos estruturais, substituição do sistema de captação de água pluvial das coberturas e substituição de forros, reforma de telhados administrativo, substituição de parte dos alambrados existentes na unidade.



Previsão de término: Julho/2025

JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.



MANUTENÇÕES CONCLUÍDAS PELA SEJUSP EM 2025

JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



MINAS
GERAIS

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Presídio de Ubá

Valor Executado: **R\$ 157.056,69**

Tipo de Recurso: **VALE**

Objeto: Execução da Rede Hidrossanitária na ETE.



100 % de execução

Status: Concluída.

Detalhamento: Execução de Rede Hidrossanitária na Estação de Tratamento de Esgoto - ETE e Instalação das Caixas d'água da Cozinha - Presídio de Ubá.



Término: Julho/2025



Presídio de Alfenas (Anexo)

Valor Executado: **R\$ 37.516,00**

Tipo de Recurso: **TJ**

Objeto: Rede Elétrica.



100 % de execução

Status: Concluída em 31/05/2025.

Detalhamento: Execução de Serviços na Rede Elétrica do Anexo por meio de Registro de Preços.



Término: Maio/2025



Penitenciária de Ribeirão das Neves I - José Maria Alkimin

Objeto: Execução de reparos preventivos e corretivos na carceragem, com geração de 151 vagas.

Valor Executado: **R\$ 9.559.033,93**

Tipo de Recurso: **VALE**



100 % de execução

Status: Concluída, com geração de 151 vagas no Pavilhão Capela.

Detalhamento: Manutenção dos telhados e da carceragem de um dos pavilhões. Essa é uma intervenção peculiar, pois o imóvel é tombado e de grande altitude, o que envolve uma grande movimentação de materiais e funcionários.



Término: Abril/2025



Centro de Treinamento GEPAER - Penitenciária de Ribeirão das Neves I - José Maria Alkimin

Objeto: Manutenção Geral na infraestrutura da Casa do GEPAER.

Valor Executado: R\$ 751.678,42

Tipo de Recurso: **VALE e EMENDA**



100 % de execução

Status: Concluída.

Detalhamento: Manutenção para reparos do telhado, elétricos, hidrossanitários, nos revestimentos, nos pisos, nas esquadrias, na pintura e em outros pontos da infraestrutura.



Término: Abril/2025



Complexo Penitenciário Nossa Senhora do Carmo - Carmo do Paranaíba

Objeto: Manutenção geral da unidade.

Valor Executado: **R\$ 1.555.260,14**



100 % de execução

Tipo de Recurso: **VALE**

Status: Intervenção concluída.

Detalhamento: Foi entregue uma primeira parte no valor de R\$ 666.109,58, onde foram realizadas intervenções no pavilhão B, incluindo os serviços de troca de toda a parte hidráulica e de esgoto das celas, serviços na parte elétrica e pintura do pavilhão. Na segunda parte, foram realizados serviços para melhoria de todo pavilhão IV.



Término: Fevereiro/2025





MANUTENÇÕES CONCLUÍDAS PELA SEJUSP EM 2024

JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



MINAS
GERAIS

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Penitenciária de Teófilo Otoni

Valor Executado: R\$ 3.859.277,92

Tipo de Recurso: **VALE**

Objeto: Manutenção geral do pavilhão individual, onde funcionará uma carceragem específica para o público LGBTQIA+, além de intervenções no Pavilhão 3, com geração de 27 vagas e novos pátios de sol.



100 % de execução

Status: Manutenção concluída.

Detalhamento: Revisão e adequação das instalações elétricas, da rede de esgoto sanitário, drenagem pluvial, instalações hidráulica, telhados, revestimento dos pisos internos, serviços de alambrado e pinturas das parede.



Término: Dezembro/2024



Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Penitenciária Agostinho de Oliveira Junior (Unaí/MG)

Objeto: Manutenção e Revitalização do Sistema de Abastecimento de Água da Penitenciária de Unaí.

Valor Executado: **R\$ 214.766,99**

Tipo de Recurso: **VALE**



100 % de execução

Status: Manutenção concluída.



Término: Dezembro/2024

Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto

Objeto: Execução de serviços para reparos e manutenção da unidade e adequação no local destinado para fábrica de fraldas.

Valor Executado: **R\$ 1.332.275,42**

Tipo de Recurso: **SEJUSP**



100 % de execução

Status: Manutenção concluída.

Execução de serviços para reparos e manutenção da unidade e adequação no local destinado para fábrica de fraldas.



Término: Novembro/2024



Cersp Gameleira

Objeto: Manutenção geral dos pavilhões com aumento de 384 novas vagas.



Valor Executado: **R\$ 4.890.888,27**

Tipo de Recurso: **VALE**



100% de execução

Status: Manutenção concluída. Foram finalizados todos os pavilhões, onde foram realizadas manutenções da rede elétrica com retirada dos pontos de energia das celas, manutenção das instalações hidráulicas e construção de treliches. Será emitida nova ordem de serviço para adequações de PSCIP.



Previsão de término: Agosto/2024



Presídio de João Monlevade

Objeto: Manutenção do pátio de sol, da carceragem e da portaria.



Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Valor Executado: **R\$ 1.198.816,15**

Tipo de Recurso: **SEJUSP**



100% de execução

Status: Manutenção Concluída. As intervenções contemplam manutenção do pátio de sol, da carceragem e da portaria.



Término: Maio/2024



JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Presídio de Teófilo Otoni

Valor Executado: R\$ 1.674.265,37

Tipo de Recurso: **SEJUSP**

Objeto: Manutenção Geral na carceragem, instalação elétrica e hidrossanitária, além de viabilização de abrigo de lixo.



100% de execução

Status: Manutenção Concluída.

Manutenção Geral na carceragem, instalação elétrica e hidrossanitária, além de viabilização de abrigo de lixo.



Término: Maio/2024

Penitenciária Professor Aluizio Ignácio de Oliveira - Uberaba

Objeto: Execução base de concreto para apoio de reservatórios de água, para revitalização do sistema de abastecimento.

Valor Executado: **R\$ 415.883,53**

Tipo de Recurso: **SEJUSP**



100% de execução

Status: Concluída.



Término: Maio/2024



Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Ceresp Betim

Objeto: Manutenção da rede elétrica geral da unidade.



Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Valor Executado: **R\$ 1.481.211,20**

Tipo de Recurso: **VALE**



100% de execução da 1ª parte

Status: Manutenção Concluída.

Adequação de toda rede elétrica e entrada de energia, além da montagem de quadro de distribuição geral da unidade (QGBT). Após essa primeira etapa, há demanda para que sejam realizadas intervenções, visando a melhoria geral da carceragem.



Término da 1ª Etapa: Março/2024

JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Hospital Jorge Vaz - Barbacena I

Valor Executado: R\$ 1.740.259,91

Objeto: Manutenção geral para atender solicitações da vigilância sanitária.

Tipo de Recurso: **SAÚDE**




100% de execução

Status: Manutenção Concluída. Foram realizados serviços de acabamento e instalações prediais, com foco nas intervenções solicitadas pela vigilância sanitária. Essa é a segunda intervenção da SEJUSP nessa edificação, que foi dividida em etapas, sendo que a primeira teve um investimento de R\$ 2.504.938,53 no seu núcleo de saúde principal.



Término: Abril/2024

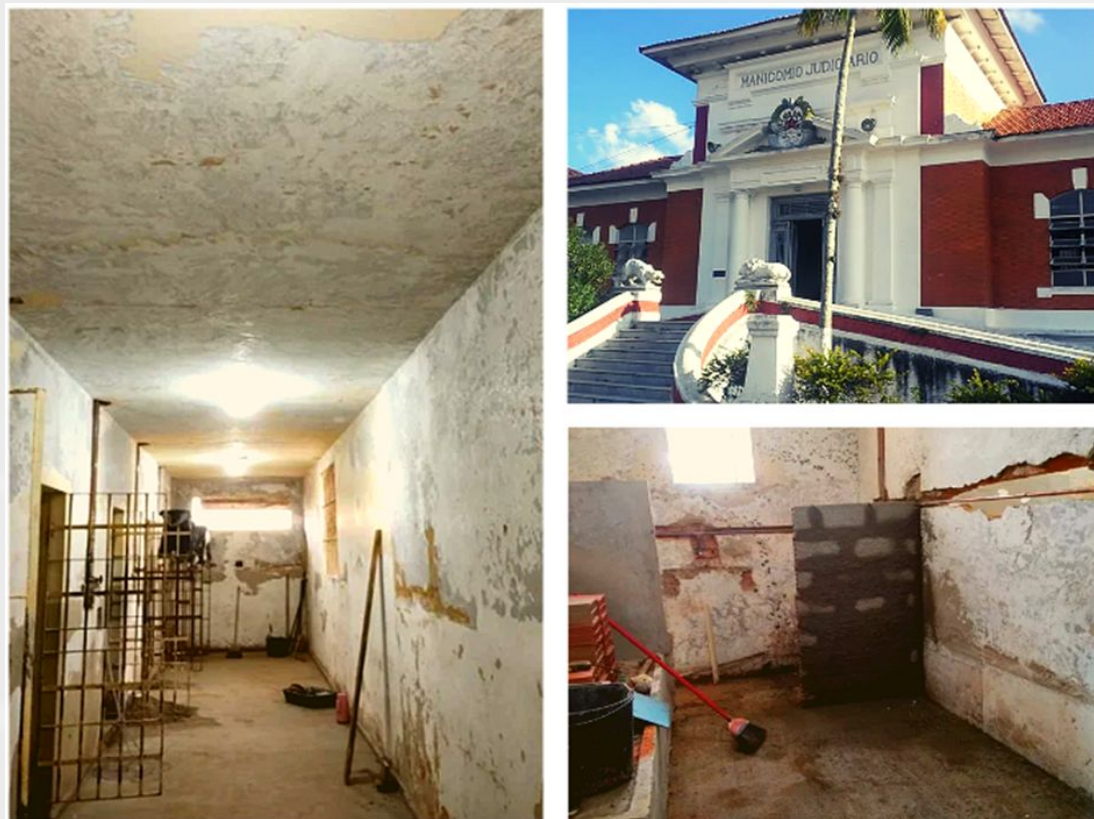

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



MINAS
GERAIS

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Penitenciária de Ribeirão das Neves I - José Maria Alkimin

Objeto: Instalações alambrado e manutenção do espaço campo futebol

Valor Executado: **R\$ 474.407,95**

Tipo de Recurso: **EMENDA PARLAMENTAR**



100% de execução

Status: Concluída em 07/03/2024. Foram realizados serviços de escavação para instalação de tubos metálicos para fixação dos alambrados.



Término: Março/2024



Complexo São Joaquim de Bicas

Valor Executado: **R\$ 423.965,72**

Objeto: Execução de Alambrado.

Tipo de Recurso: **SEJUSP**



100% de execução

Status: Concluída em 29/02/2024. Foram realizados serviços de escavação para instalação de tubos metálicos para fixação dos alambrados.



Término: Fevereiro/2024

Presídio de Vespasiano

Objeto: Revitalização do pavilhão principal da Unidade Prisional, focado na revisão da rede hidráulica, esgoto e elétrica.

Valor Executado: **R\$ 1.499.534,84**

Tipo de Recurso: **VALE e SEJUSP**



100% de execução

Status: Manutenção Concluída. A manutenção foi realizada em 3 etapas: o pavilhão foi dividido em dois blocos para facilitar a logística dos serviços, resultando nas duas primeiras partes da manutenção, além de serviços de revitalização de esgoto no Anexo Seguro.



Término: Janeiro/2024



Penitenciária de Ribeirão das Neves I - José Maria Alkimin

Objeto: Manutenção geral do prédio administrativo da unidade onde funcionará também o almoxarifado.

Valor Executado: **R\$ 2.136.673,90**

Tipo de Recurso: **VALE**



100% de execução

Status: Manutenção Concluída. Serviços para melhoria do local onde funcionará o almoxarifado demais serviços de acabamento interno.



Término: Janeiro/2024



Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.



OBRAS E REFORMAS DA SEJUSP CONCLUÍDAS PELA SEINFRA

JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



MINAS
GERAIS

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

CIA-BH

Objeto: Execução das Obras de Reforma e Adequação.

Valor Executado: **R\$ 1.002.486,84**

Tipo de Recurso: **VALE**



100 % de execução física

Status: Obra concluída.

Detalhamento: A obra contempla a reforma e Adequação do Primeiro Subsolo do Prédio do TJMG para abrigar o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional de Belo Horizonte - CIA/BH.



Término: Dezembro/2024



Complexo Penitenciário Nelson Hungria

Objeto: Reforma da muralha, passarela e guaritas.

Valor Executado: **R\$ 11.947.944,85**

Tipo de Recurso: **VALE e SEJUSP**



100 % de execução

Status: Obra concluída. A obra contempla a reforma e reforço estrutural de toda muralha, da passarela e das guaritas.



Término: Outubro/2024



Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

CSE São Benedito

Objeto: Reforma geral.



Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Valor Executado: **R\$ 762.664,22**

Tipo de Recurso: **VALE**



100 % de execução

Status: Obra concluída.

Foi realizada reforma geral da cobertura (telhados) existentes, pintura geral interna e externa dos núcleos e administrativo, execução de instalações elétricas e hidráulicas dos núcleos e instalação de caixa d'água de 30 mil litros, além de substituição de parte de placa solar.



Término: Julho/2024



JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA




**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Presídio de Ubá (2ª Etapa)

Objeto: Conclusão da construção da Cadeia Pública masculina de Ubá - padrão 388 vagas.

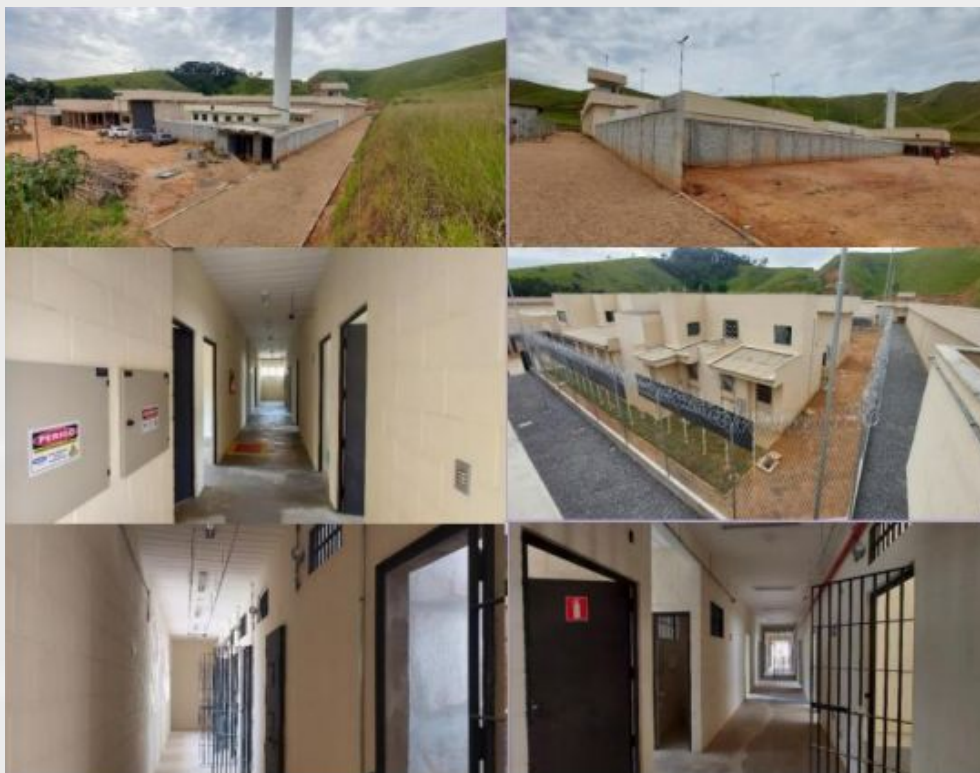

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Valor Executado: **R\$ 2.384.230,00**

Tipo de Recurso: **CEF**



100 % de execução

Status: Obra concluída.

As obras tiveram início em 08/06/2015. A primeira parte foi encerrada com 90,73%, uma vez que o contrato não permitiu novo aditamento. Diante disso, foi realizada nova etapa para conclusão da obra. As obras foram concluídas em maio e o AVCB foi emitido em Julho.



Término: Maio/2024



JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.



OBRAS EXECUTADAS PELA VALE

JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



MINAS
GERAIS

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Construção do Presídio em Lavras

Status: As obras estão em andamento regular, com previsão de geração de 628 vagas.



Início: Março/2024



Previsão de término: Fevereiro/2026

Construção do Presídio em Poços de Caldas

Status: As obras estão em andamento regular, com previsão de geração de 628 vagas.



Início: Junho/2024



Previsão de término: Setembro/2026
